

つむぎ 導入展開・バージョン計画

2026年9月～2027年3月

作成日: 2026年9月1日 作成: 本部(ワズスタイル) 対象: 全FC店舗・FCコンサルタント共有用 版: 第4版

1. 結論

方針

バージョン1は「現行機能+ケアマネ閲覧の自動化」で確定し、10月1日に正式リリース(v1.0)。新機能はバージョン2として扇橋店で先行試験し、12月のV1.1(LIFE・送迎表・モニタリングFAX)と1月のV1.2(電子契約・同意書・メール通知)の2回に分けてアップデート配信する。

- ケアマネ閲覧の自動化はV1に含める — どの店舗でもケアマネ登録が始まる可能性があるため。9月前半に実装し、扇橋の受入確認で検証してからリリースする。
- LIFEをV1に含めない理由 — 実装約3週間+提出2サイクルの試験(2ヶ月)が必要で、含めると正式版が12月にずれ込み10月目標と両立しない。加えて2026年9月1日に旧LIFEが停止し国保中央会の新システムへ移管された直後で、当社の外に変動要素がある。
- 送迎表は日常業務のため前倒し — 基本版(週間運行表+地図共有)を10月に実装し、12月のV1.1で全店へ。AIによる送迎順自動作成はV3(2027年春)で拡張する。

2. バージョン管理・配信の方式(業界標準に準拠)

つむぎの更新の仕組みは、独自方式ではなく**主要WebサービスとSaaSで標準的に使われている手法**の組み合わせです。

手法(業界での呼称)	有名サービスでの例	つむぎでの適用
フィーチャーフラグ+段階的ロールアウト (カナリアリリース)	Google・Meta・Netflixなどが新機能を社内→一部ユーザー→全体の順で有効化	コードは1本のまま、店舗ごとの機能スイッチでV2機能を扇橋のみON→問題なければ全店ON
リリーストレイン(定期リリース)	Chrome・Firefoxは機能の完成を待たず決まった周期で版を出す	メジャー更新は四半期1回。期限を先に決め、間に合った機能だけ乗せる
セマンティックバージョンング	多くのソフトの「v1.2.3」表記(大改訂.機能追加.修正)	v1.0(10/1)→v1.1(12月)→v1.2(1月)。アプリ内にも版数を表示
更新バナー+バックグラウンド自動更新	SlackやGmailの「新しいバージョンがあります。再読み込みしてください」	全店向け更新はバナー表示、試作店舗向けは無音配信(裏で自動更新)を選択可能
チェンジログ(更新履歴)の公開	Notion・Figmaなどの「What's New / リリースノート」	変更管理台帳(全件)+アプリ内「つむぎ運営からのお知らせ」


- **バグ修正の反映** — コードが1本のため、V1で見つけたバグの修正は自動的にV2にも反映される(逆も同じ)。取りこぼしが構造的に起きない。
- **新機能のアイデア** — すべて「未来の修正点」リストへ記録し、四半期ごとのバージョン計画で採否と優先度を決定する。

3. 店舗展開フェーズ

フェーズ	店舗	位置づけ	V1運用開始	備考
第0陣	扇橋店	試作店舗(パイロット)	9月中(受入確認)	V1最終チェック+V2先行試験を兼務
第1陣	南水元店・東小岩店・江古田店	提供記録・日誌を活用中	10月1日	すでに利用中のため「正式版への切替」。移行負担は小さい
第2陣	西馬込店・水元店	関心あり・運用開始前	10月13日	9月末から初期設定・研修(2〜3週間)を実施してから開始
第3陣	その他店舗	関心が薄い層	11月〜12月	説明会→月2店舗ペースの伴走導入。第1陣の実績数値を材料に案内

各店舗の導入窓口は店舗の管理者とする(つむぎの操作の中心が管理者のため)。研修・問い合わせ・受入確認・テスト協力の依頼はすべて管理者経由で行う。

4. ガントチャート

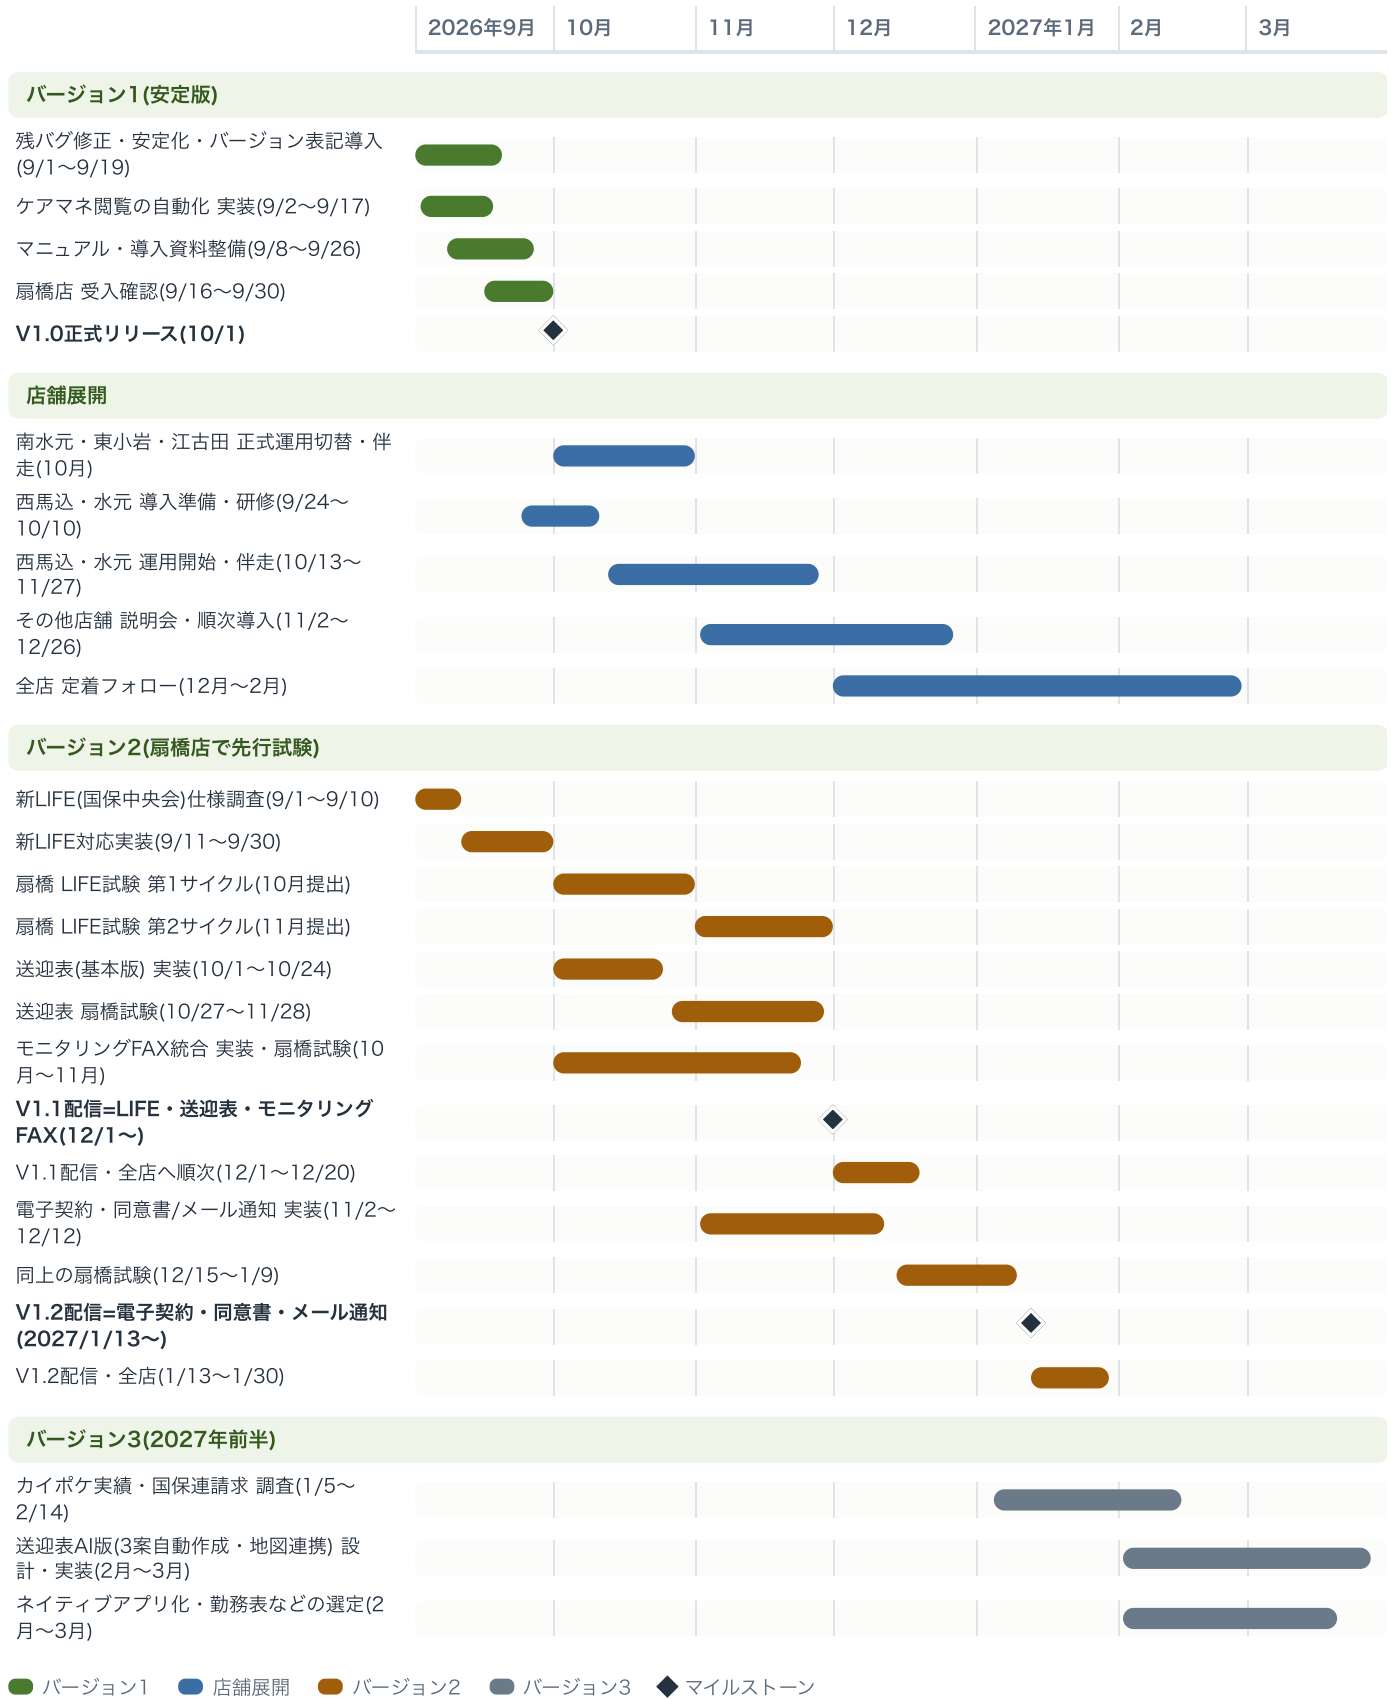

LIFEの提出はサービス提供月の翌月10日が期限のため、各サイクルの頭10日で提出し、残りで検証・修正を行います。新LIFE側の障害等があれば試験を1サイクル延長し、V1.1は1月後ろ倒します(V1の展開には影響させない)。

5. 各バージョンのスコープ

バージョン1 = v1.0(2026年10月1日 正式リリース・機能凍結)

- ・ 利用者マスタ管理(名簿・フェイスシート・保険証/負担割合証・履歴・CSV入出力)
- ・ サービス提供記録入力・業務日誌・連絡帳・カレンダー(休業日/半日休業対応)
- ・ 月間スケジュール・振替・欠席/休止管理、体力測定、モニタリング(AI下書き・自動FAX)
- ・ 通所介護計画書・機能訓練計画書・初回報告、担当者会議記録(フロートメモ)
- ・ 家族・ご本人・ケアマネの閲覧ポータル(招待メール・パスワード自己リセット・お知らせ配信)
- ・ **ケアマネ閲覧の自動化** — 担当者単位のアカウント: 1回の登録で担当利用者を自動閲覧・担当変更で自動切替
- ・ ケアマネ事業所・担当者管理、分析(個人/稼働・定員ベース稼働率)、複数端末同期の保護機構

バージョン2 → V1.1(12月)・V1.2(2027年1月)として配信

- ・ **新LIFE(国保中央会)対応** — 4様式CSV提出支援・過去データのリカバリー出力・フィードバック票取込【V1.1】
- ・ **送迎表(基本版・前倒し)** — 日誌の車両・定員をもとに週間運行表(左から営業曜日、上段=迎え/下段=送り、氏名・迎え時間・次回曜日)。時間は連絡帳へ自動反映、休業・振替・休止も反映。Googleマップのルート共有リンクでスマホへ共有【V1.1】
- ・ **モニタリングFAXの統合** — まるっとLIFEで行っているモニタリング業務をつむぎへ一本化(新LIFE移行と同時)【V1.1】
- ・ **電子契約書・同意書** — 紙の契約・同意手続きの電子化【V1.2】
- ・ **ご家族への通知(メール)** — 既存のメール基盤で実装(追加費用ほぼゼロ)。LINEは利用状況を見て採否判断【V1.2】

バージョン3(2027年前半)

- ・ **送迎表AI版** — 住所・歩行状況・乗降所要時間・定員から送迎順を自動作成し3案提示(時間優先/距離優先/バランス)→自由編集。走行距離・所要時間・概算燃料費表示、地図ルート連携
- ・ カイポケ実績機能相当の実績管理・国保連請求(伝送) — 1月に調査開始、要件と費用対効果で着手判断
- ・ ネイティブアプリ化(iPad/スマホ/PCのインストール型アプリ)、勤務表(シフト)の本格運用

さらに先の構想(バージョン4以降)

- ・ LINE通知(メール通知の利用状況を見て)、多店舗横断の経営分析、計画書と外部システムの連携拡充 ほか

6. 端末と通信の方針

端末

用途	推奨	理由
現場での入力(記録・日誌・バイタル)	iPad等のタブレット	タップ入力が速い。持ち運びやすく担当者会議など外出先でも使える
印刷・帳票・管理業務	PC(各店舗に1台)	タブレットのブラウザ印刷は余白・ヘッダー/フッターの制御が難しく、帳票の仕上がりが安定しない。印刷はPCに寄せる
1台で済ませたい店舗	Windowsの2in1(タブレット型PC)	タブレット入力とPC品質の印刷を1台で両立できる折衷案

外出時の通信(訪問1回1時間程度・少量通信)

ポケットWi-Fiは今回の用途には過剰で、持ち出すと店舗で使えない問題もあるため推奨しません。つむぎの入力は文字中心で通信量が小さく、次の順で検討するのが低コストです。

順位	方法	月額目安	備考
1	スマホのテザリング(社用・スタッフ携帯)	0円	追加契約なし。まずこれで運用開始し、不便なら次へ
2	セルラー版iPad+povo2.0(eSIM)	基本0円	基本料0円で維持し、使う時だけ購入(例: 1GB/30日 390円前後)。半年に1回は有料購入が必要な点のみ注意
3	少量データSIM(日本通信 1GB 約290円/IIJmio データeSIM 2GB 440～850円)	300～900円	毎月確実に外出があるならこちら。eSIMなら即日開通

7. 主要マイルストーン

- 9月17日 — ケアマネ閲覧の自動化 実装完了(扇橋で検証開始)
- 9月30日 — V1機能凍結完了・扇橋店受入確認完了・第2陣研修完了・新LIFE実装完了
- 10月1日 — v1.0正式リリース。第1陣(南水元・東小岩・江古田)正式運用
- 10月13日 — 第2陣(西馬込・水元)運用開始
- 10月24日 — 送迎表(基本版)実装完了→扇橋試験へ
- 11月10日 — LIFE試験 第2サイクル提出完了(扇橋店)
- 12月1日 — V1.1(LIFE・送迎表・モニタリングFAX)配信開始
- 12月26日 — 第3陣導入完了(全店V1稼働)
- 2027年1月13日 — V1.2(電子契約・同意書・メール通知)配信開始
- 2027年2月末 — 全店定着フォロー完了・V3計画確定

8. 品質保証(テスト運用)

システム安定のため、業界標準のテスト運用(回帰テスト・スモークテスト・受入テスト)を導入します。全テスト項目は「つむぎ テスト項目一覧」として一覧化し、**正常系・準正常系・異常系**の3層で管理します(同期系・操作系・帳票系・アカウント系・外部連携系など16分類・約70項目)。

- **項目は減らさない** — 一度追加したテスト項目は、その機能が廃止されない限り削除しない(新機能で増える一方でよい)。過去の不具合の再発防止を積み上げる回帰テストの標準的な考え方。
- **毎デプロイ(自動)** — 構文検査・データ整合・本番生存確認など14項目を自動実行し、失敗したら配信しない。
- **月1回(スモーク)** — 扇橋店で主要26項目を約30分で実施。
- **四半期(全量)** — V1.x配信の前に全項目を実施。新機能はテスト項目を追加してからスイッチONする。
- **厳しさ** — 厳しめを基準とする。介護記録は行政監査・請求根拠・個人情報に関わるため、同期系とアカウント系は異常系(通信断・同時編集・不正操作)まで必須。表示系は正常+準正常中心とメリハリをつける。

9. 前提とリスク

リスク / 前提	影響	対応
新LIFEシステムの仕様変更・障害	V1.1が最大1ヶ月遅延	試験を1サイクル延長できる余白を確保。V1展開には影響させない
ケアマネ自動化のV1組込みによる9月の作業増	受入確認の圧迫	9/17実装完了を厳守。間に合わない場合は自動化のみ10月中旬のv1.0.1へ後ろ倒しし、リリース日は動かさない
V1.1の同梱数増(LIFE+送迎表+FAX統合)	試験が浅くなる	優先順はLIFE→送迎表→FAX統合。試験で問題が出た機能は外してV1.2へ回す(配信日は守る)
第3陣店舗の関心の低さ	導入の形骸化	第1陣の実績数値を説明会の材料に、月2店舗の伴走導入
V1凍結後の機能要望	スコープ再膨張	要望は「未来の修正点」へ記録し四半期計画で優先度判断
