

つむぎ 導入展開・バージョン計画

2026年9月～2027年3月

作成日: 2026年9月1日(9/2改訂) 作成: 本部(ワズスタイル) 対象: 全FC店舗・FCコンサルタント共有用 版: 第2版

1. 結論

方針

バージョン1は「現行機能+ケアマネ閲覧の自動化」で確定し、10月1日に正式リリース。LIFE対応・電子契約・モニタリングFAX・LINE通知はバージョン2として扇橋店で先行試験し、12月(LIFE)と1月(その他)にV1のアップデートとして配信する。

- ・ **ケアマネ閲覧の自動化はV1に含める** — どの店舗でもケアマネ登録が始まる可能性があるため。9月前半に実装し、扇橋の受入確認で検証してからリリースする。
- ・ **LIFEをV1に含めない理由** — 実装約3週間+提出2サイクルの試験(2ヶ月)が必要で、含めると正式版が12月にずれ込み10月目標と両立しない。加えて2026年9月1日に旧LIFEが停止し国保中央会の新システムへ移管された直後で、当社の外に変動要素がある。
- ・ **V1の価値は「毎日の運用が回ること」** — 記録・日誌・モニタリング・計画書・閲覧ポータルは全店必須。加算系(LIFE)は算定店舗のみが対象で、版を分けるのが自然。

2. バージョン1とバージョン2の運用方法


コードを2本に分けるのではなく、**コードは1本のまま「店舗ごとの機能スイッチ」で切り替える方式**を採用します(つむぎに既にあるアドオン機構を利用)。

- ・ **V1(安定版)** — 機能を凍結。全店舗はこの状態で運用。新機能のスイッチは全店OFF。
- ・ **V2(開発版)** — 新機能を実装したら扇橋店だけスイッチON。他店には画面も出ないため影響ゼロ。
- ・ **昇格** — 扇橋で2サイクル(約2ヶ月)問題なければ、スイッチを全店ONにして「V1.1」「V1.2」として配信。
- ・ **バグ修正の反映(ご質問への回答)** — コードが1本なので、**V1で見つけたバグの修正は自動的にV2にも反映されます**(逆も同じ)。「V1を直したのにV2で直っていない」という取りこぼしが構造的に起きません。これが2本立て開発ではなくスイッチ方式を推す最大の理由です。
- ・ **思いついた新機能** — すべて「未来の修正点」リストに記録→四半期ごとのバージョン計画で採否と優先度を決定。期限を先に切ってから作ります。

3. 店舗展開フェーズ

フェーズ	店舗	位置づけ	V1運用開始	備考
第0陣	扇橋店	試作店舗(パイロット)	9月中(受入確認)	V1最終チェック+V2先行試験を兼務
第1陣	南水元店・東小岩店・江古田店	提供記録・日誌を活用中	10月1日	すでに利用中のため「正式版への切替」。移行負担は小さい
第2陣	西馬込店・水元店	関心あり・運用開始前	10月13日	9月末から初期設定・研修(2〜3週間)を実施してから開始
第3陣	その他店舗	関心が薄い層	11月〜12月	説明会→月2店舗ペースの伴走導入。第1陣の実績数値を材料に案内

4. ガントチャート

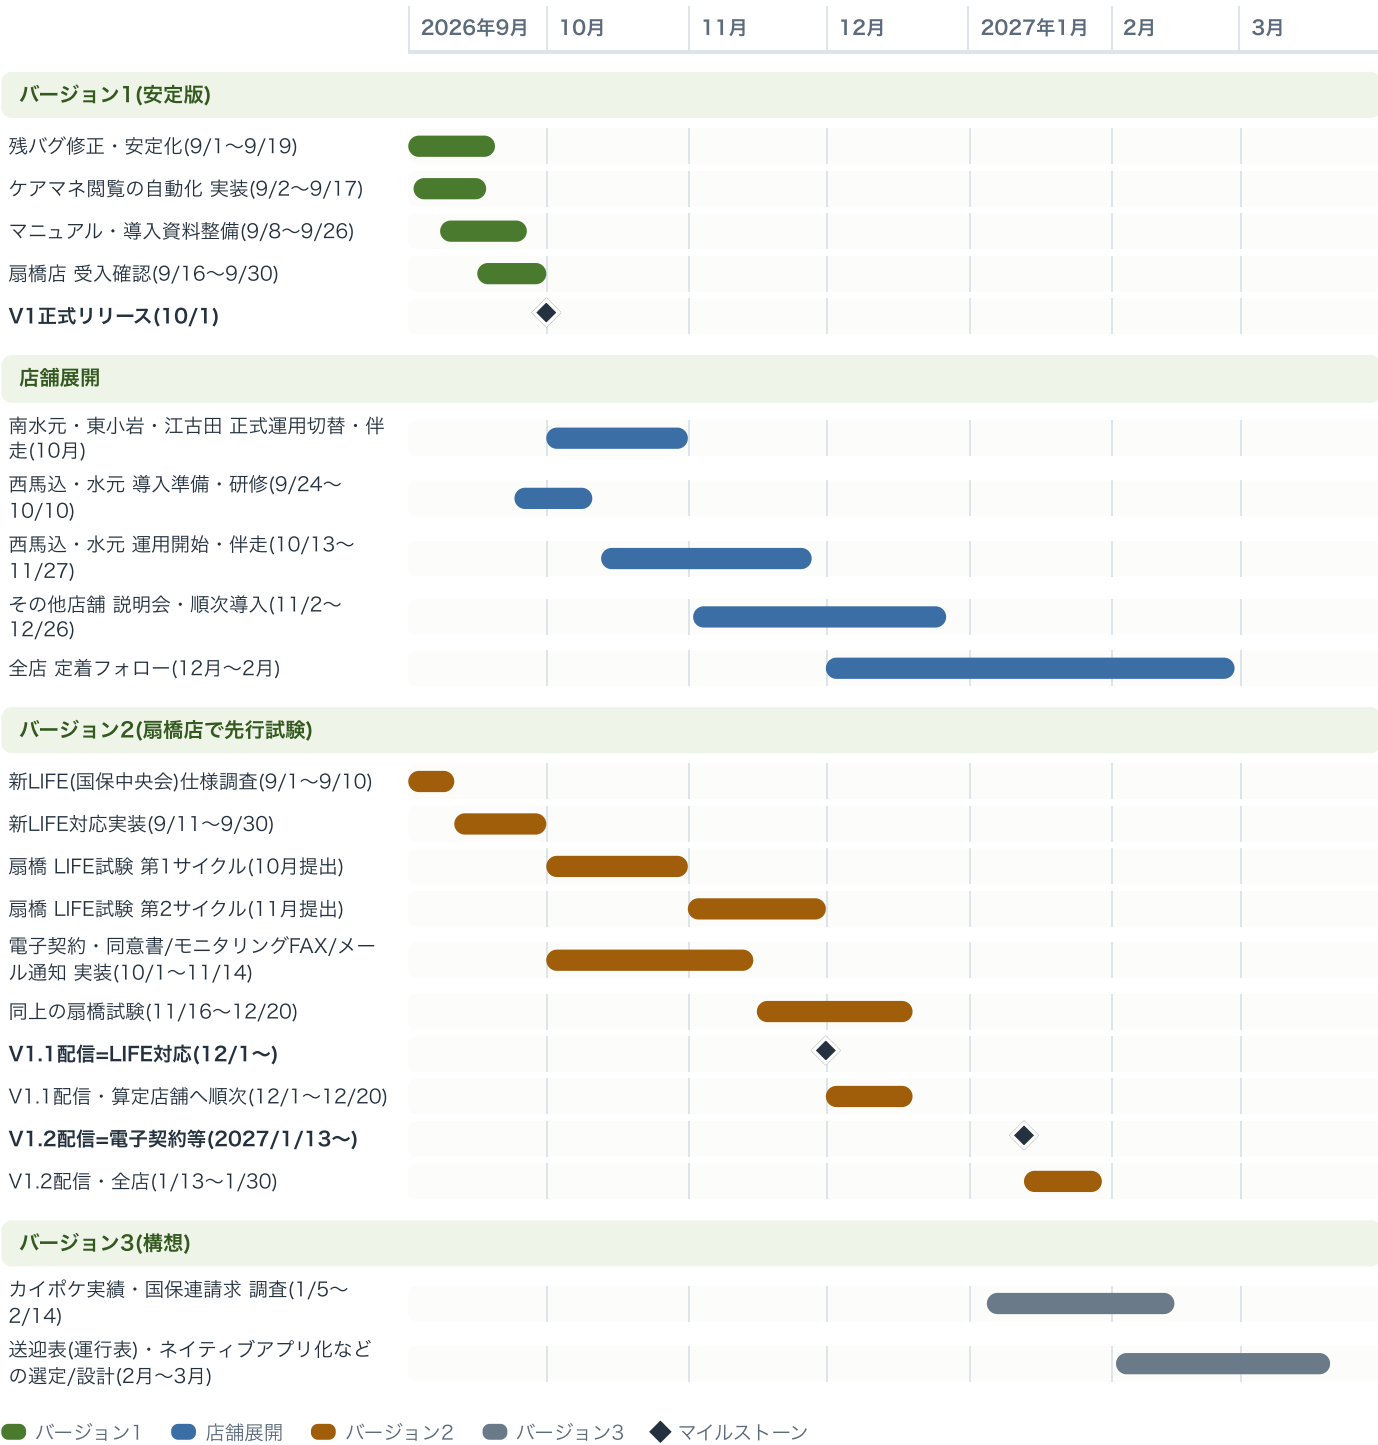

LIFEの提出はサービス提供月の翌月10日が期限のため、各サイクルの頭10日で提出し、残りで検証・修正を行います。新LIFE側の障害等があれば試験を1サイクル延長し、V1.1は1月へ後ろ倒しします(V1の展開には影響させない)。

5. 各バージョンのスコープ

バージョン1(2026年10月1日 正式リリース・機能凍結)

- 利用者マスタ管理(名簿・フェイスシート・保険証/負担割合証・履歴・CSV入出力)
- サービス提供記録入力・業務日誌・連絡帳・カレンダー(休業日/半日休業対応)

- ・ 月間スケジュール・振替・欠席/休止管理、体力測定、モニタリング(AI下書き・自動FAX)
- ・ 通所介護計画書・機能訓練計画書・初回報告、担当者会議記録(フロートメモ)
- ・ 家族・ご本人・ケアマネの閲覧ポータル(招待メール・パスワード自己リセット・お知らせ配信)
- ・ **ケアマネ閲覧の自動化(今回V1へ格上げ)** — 担当者単位のアカウント: ケアマネが1回登録すれば担当利用者を自動で閲覧でき、利用者マスタで担当を変更すると自動で閲覧が切り替わる
- ・ ケアマネ事業所・担当者管理(招待・登録状況)、分析(個人/稼働・定員ベース稼働率)
- ・ 複数端末同期の保護機構(項目単位マージ・楽観ロック・変更管理台帳)

バージョン2(扇橋店で試験 → V1.1/V1.2として配信)

- ・ **新LIFE(国保中央会)対応** — 4様式CSV提出支援・過去データのリカバリー出力・フィードバック票取込(12月にV1.1として算定店舗へ)
- ・ **モニタリングFAXの統合** — 現在「まるっとLIFE」で行っているモニタリング業務をつむぎへ一本化(新LIFE移行と同時に切替)
- ・ **電子契約書・同意書** — 紙の契約・同意手続きの電子化
- ・ **ご家族への通知(メール優先・LINEは任意)** — まずメール通知で実装(招待メール等で使用中の既存基盤をそのまま利用でき、追加費用ほぼゼロ・実装も軽い)。LINE通知は無料枠が月200通で超過時に有料プランとなるため、メール通知の利用状況と要望を見てから採否判断

バージョン3以降(2027年・構想)

- ・ カイポケ実績機能相当の実績管理・国保連請求(伝送) — 1月に調査開始、要件と費用対効果で着手判断
- ・ **送迎表(運行表)** — 日誌の車両・定員をもとに週間運行表を自動生成(左から営業曜日、上段=迎え/下段=送り、氏名・迎え時間・次回曜日表示)。設定時間は連絡帳へ自動反映、休業・振替・休止も反映。第2段階としてAIによる送迎順の自動作成(住所・歩行状況・乗降所要時間から3案提示→自由編集)、Googleマップのルート共有、走行距離・所要時間・概算燃料費の表示を構想
- ・ ネイティブアプリ化 — ウェブ版に加えiPad/スマホ/PCの「インストール型アプリ」として提供(まずホーム画面アプリの強化→ストア配布の順で検討)
- ・ 勤務表(シフト)の本格運用 ほか

6. 端末と通信の方針

端末

用途	推奨	理由
現場での入力(記録・日誌・バイタル)	iPad等のタブレット	タップ入力が速い。持ち運びやすく担当者会議など外出先でも使える
印刷・帳票・管理業務	PC(各店舗に1台)	タブレットのブラウザ印刷は余白・ヘッダー/フッターの制御が難しく、帳票の仕上がりが安定しない。印刷はPCに寄せる
1台で済ませたい店舗	Windowsの2in1(タブレット型PC)	タブレット入力とPC品質の印刷を1台で両立できる折衷案

外出時の通信(訪問1回1時間程度・少量通信)

ポケットWi-Fi(月3,000～4,000円台)は今回の用途には過剰で、持ち出すと店舗で使えない問題もあるため推奨しません。つむぎの入力は文字中心で通信量が小さく(1時間で数十MB程度)、次の順で検討するのが低コストです。

順位	方法	月額目安	備考
1	スマホのテザリング(社用・スタッフ携帯)	0円	追加契約なし。ほとんどの携帯プランでテザリングは無料。まずこれで運用開始し、不便なら次へ
2	セルラー版iPad+povo2.0(eSIM)	基本0円	基本料0円で維持し、使う時だけ購入(例: 1GB/30日 390円前後)。半年に1回は有料購入が必要な点のみ注意
3	少量データSIM(日本通信 1GB 約290円/IIJmio データeSIM 2GB 440～850円)	300～900円	毎月確実に外出があるならこちら。eSIMなら即日開通

7. 主要マイルストーン

- 9月17日 — ケアマネ閲覧の自動化 実装完了(扇橋で検証開始)
- 9月30日 — V1機能凍結完了・扇橋店受入確認完了・第2陣研修完了・新LIFE実装完了
- 10月1日 — V1正式リリース。第1陣(南水元・東小岩・江古田)正式運用
- 10月13日 — 第2陣(西馬込・水元)運用開始
- 11月10日 — LIFE試験 第2サイクル提出完了(扇橋店)
- 12月1日 — V1.1(LIFE対応・モニタリングFAX統合)配信開始
- 12月26日 — 第3陣導入完了(全店V1稼働)
- 2027年1月13日 — V1.2(電子契約・同意書・LINE通知)配信開始
- 2027年2月末 — 全店定着フォロー完了・V3計画確定

8. 前提とリスク

リスク / 前提	影響	対応
新LIFEシステムの仕様変更・障害	V1.1が最大1ヶ月遅延	試験を1サイクル延長できる余白を確保。V1展開には影響させない
ケアマネ自動化のV1組込みによる9月の作業増	受入確認の圧迫	9/17実装完了を厳守。間に合わない場合は自動化のみ10月中旬のV1.0.1へ後ろ倒しし、リリース日は動かさない
第3陣店舗の関心の低さ	導入の形骸化	第1陣の実績数値を説明会の材料に、月2店舗の伴走導入
V1凍結後の機能要望	スコープ再膨張	要望は「未来の修正点」へ記録し四半期計画で優先度判断
通知手段の選定(メール/LINE)	ランニングコスト増	まず既存メール基盤で通知を実装(追加費用ほぼゼロ)。LINEは要望と通知量を見てから有料プラン込みで採否判断
