

つむぎ 導入展開・バージョン計画

2026年9月～2027年3月

作成日: 2026年9月1日 作成: 本部(ワズスタイル) 対象: 全FC店舗・FCコンサルタント共有用 版: 第3版

1. 結論

方針

バージョン1は「現行機能+ケアマネ閲覧の自動化」で確定し、10月1日に正式リリース(v1.0)。新機能はバージョン2として扇橋店で先行試験し、12月のV1.1(LIFE・送迎表・モニタリングFAX)と1月のV1.2(電子契約・同意書・メール通知)の2回に分けてアップデート配信する。

- ケアマネ閲覧の自動化はV1に含める — どの店舗でもケアマネ登録が始まる可能性があるため。9月前半に実装し、扇橋の受入確認で検証してからリリースする。
- LIFEをV1に含めない理由 — 実装約3週間+提出2サイクルの試験(2ヶ月)が必要で、含めると正式版が12月にずれ込み10月目標と両立しない。加えて2026年9月1日に旧LIFEが停止し国保中央会の新システムへ移管された直後で、当社の外に変動要素がある。
- 送迎表は日常業務のため前倒し — 基本版(週間運行表+地図共有)を10月に実装し、12月のV1.1で全店へ。AIによる送迎順自動作成はV3(2027年春)で拡張する。

2. バージョン管理・配信の方式(業界標準に準拠)

つむぎの更新の仕組みは、独自方式ではなく**主要WebサービスとSaaSで標準的に使われている手法**の組み合わせです。


手法(業界での呼称)	有名サービスでの例	つむぎでの適用
フィーチャーフラグ+段階的ロールアウト (カナリアリリース)	Google・Meta・Netflixなどが新機能を社内→一部ユーザー→全体の順で有効化	コードは1本のまま、店舗ごとの機能スイッチでV2機能を扇橋のみON→問題なければ全店ON
リリーストレイン(定期リリース)	Chrome・Firefoxは機能の完成を待たず決まった周期で版を出す	メジャー更新は四半期1回。期限を先に決め、間に合った機能だけ乗せる
セマンティックバージョンング	多くのソフトの「v1.2.3」表記(大改訂.機能追加.修正)	v1.0(10/1)→v1.1(12月)→v1.2(1月)。アプリ内にも版数を表示
更新バナー+バックグラウンド自動更新	SlackやGmailの「新しいバージョンがあります。再読み込みしてください」	全店向け更新はバナー表示、試作店舗向けは無音配信(裏で自動更新)を選択可能
チェンジログ(更新履歴)の公開	Notion・Figmaなどの「What's New / リリースノート」	変更管理台帳(全件)+アプリ内「つむぎ運営からのお知らせ」

- **バグ修正の反映** — コードが1本のため、V1で見つけたバグの修正は自動的にV2にも反映される(逆も同じ)。取りこぼしが構造的に起きない。
- **新機能のアイデア** — すべて「未来の修正点」リストへ記録し、四半期ごとのバージョン計画で採否と優先度を決定する。

3. 店舗展開フェーズ

フェーズ	店舗	位置づけ	V1運用開始	備考
第0陣	扇橋店	試作店舗(パイロット)	9月中(受入確認)	V1最終チェック+V2先行試験を兼務
第1陣	南水元店・東小岩店・江古田店	提供記録・日誌を活用中	10月1日	すでに利用中のため「正式版への切替」。移行負担は小さい
第2陣	西馬込店・水元店	関心あり・運用開始前	10月13日	9月末から初期設定・研修(2〜3週間)を実施してから開始
第3陣	その他店舗	関心が薄い層	11月〜12月	説明会→月2店舗ペースの伴走導入。第1陣の実績数値を材料に案内

4. ガントチャート

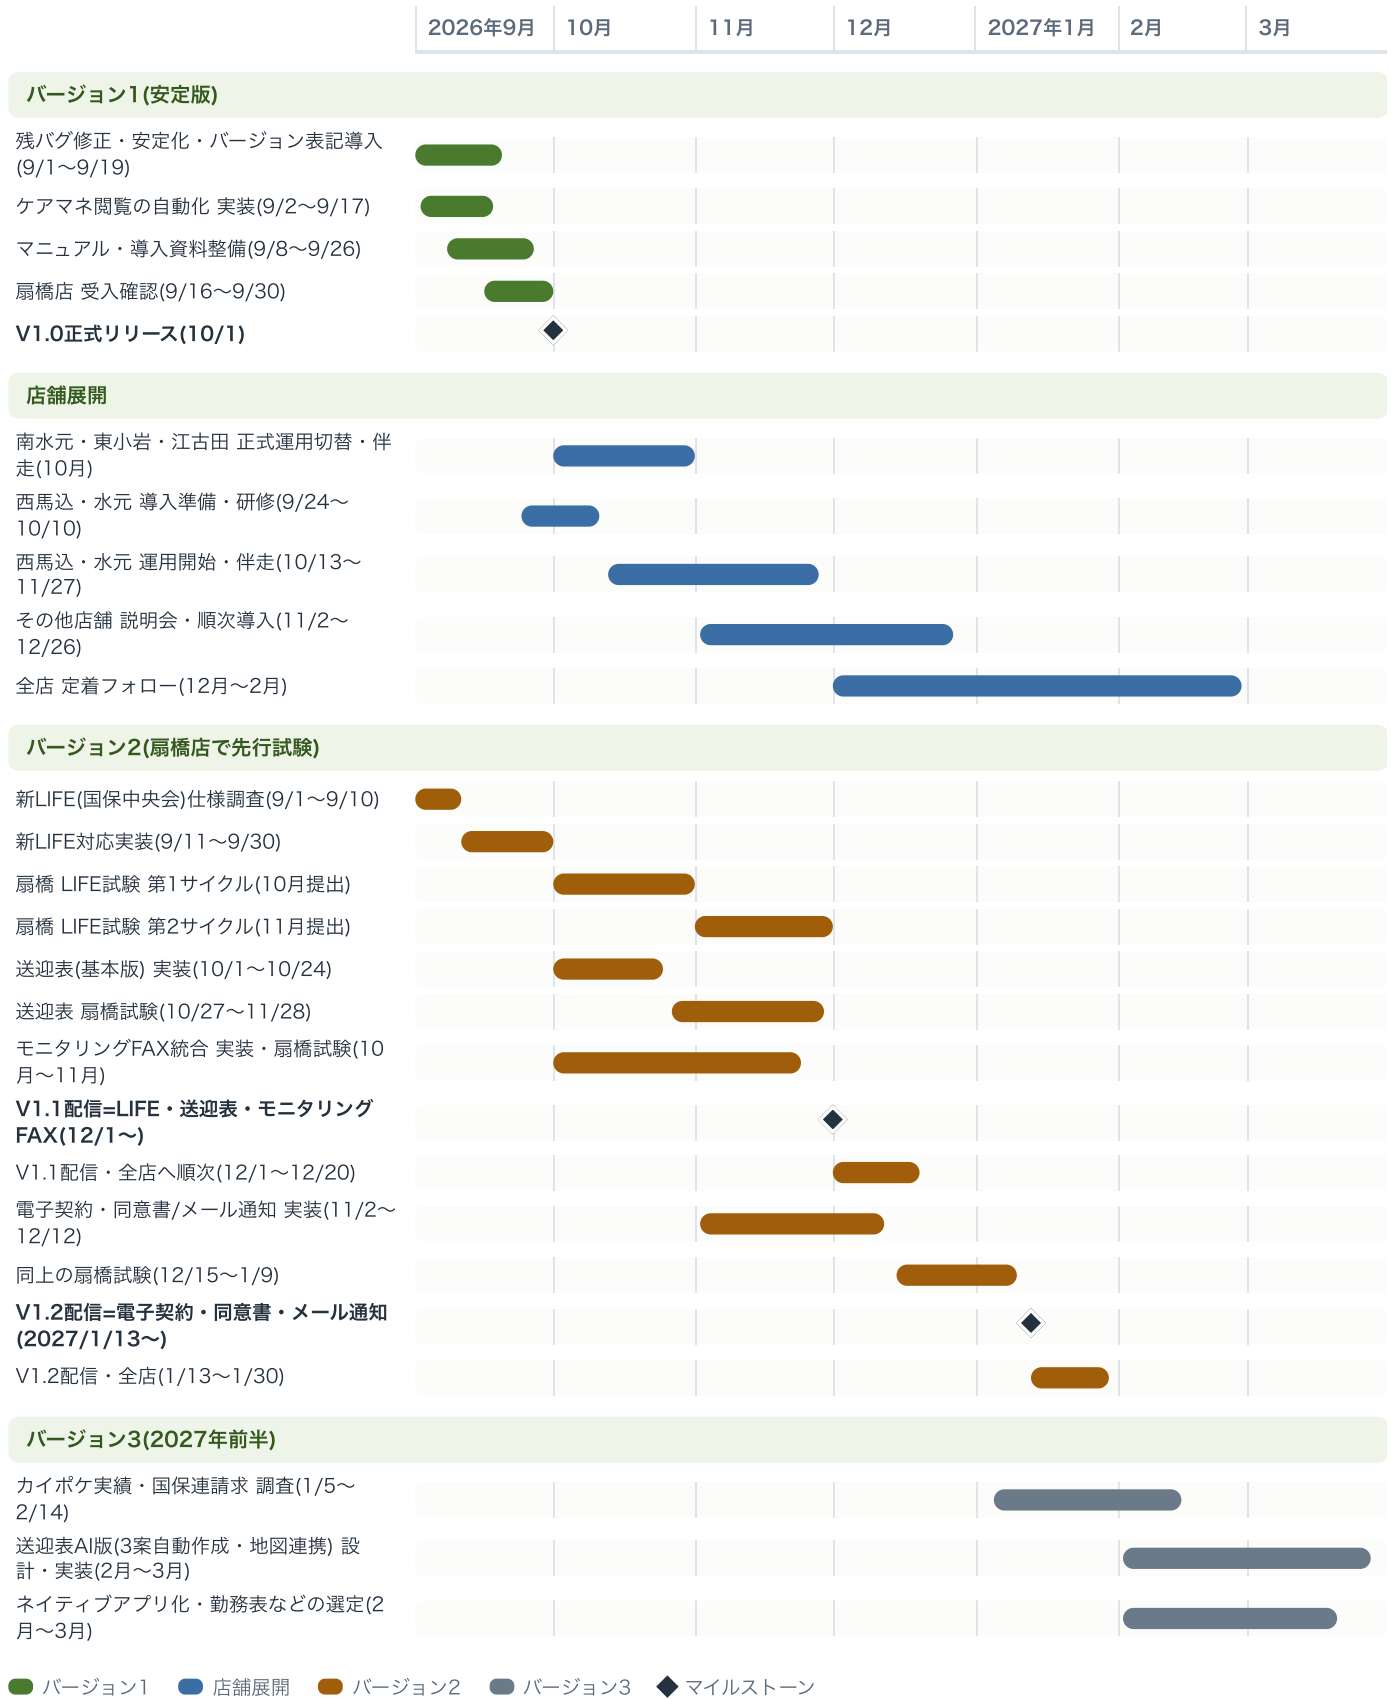

LIFEの提出はサービス提供月の翌月10日が期限のため、各サイクルの頭10日で提出し、残りで検証・修正を行います。新LIFE側の障害等があれば試験を1サイクル延長し、V1.1は1月後ろ倒しします(V1の展開には影響させない)。

5. 各バージョンのスコープ

バージョン1 = v1.0(2026年10月1日 正式リリース・機能凍結)

- ・ 利用者マスタ管理(名簿・フェイスシート・保険証/負担割合証・履歴・CSV入出力)
- ・ サービス提供記録入力・業務日誌・連絡帳・カレンダー(休業日/半日休業対応)
- ・ 月間スケジュール・振替・欠席/休止管理、体力測定、モニタリング(AI下書き・自動FAX)
- ・ 通所介護計画書・機能訓練計画書・初回報告、担当者会議記録(フロートメモ)
- ・ 家族・ご本人・ケアマネの閲覧ポータル(招待メール・パスワード自己リセット・お知らせ配信)
- ・ **ケアマネ閲覧の自動化** — 担当者単位のアカウント: 1回の登録で担当利用者を自動閲覧・担当変更で自動切替
- ・ ケアマネ事業所・担当者管理、分析(個人/稼働・定員ベース稼働率)、複数端末同期の保護機構

バージョン2 → V1.1(12月)・V1.2(2027年1月)として配信

- ・ **新LIFE(国保中央会)対応** — 4様式CSV提出支援・過去データのリカバリー出力・フィードバック票取込【V1.1】
- ・ **送迎表(基本版・前倒し)** — 日誌の車両・定員をもとに週間運行表(左から営業曜日、上段=迎え/下段=送り、氏名・迎え時間・次回曜日)。時間は連絡帳へ自動反映、休業・振替・休止も反映。Googleマップのルート共有リンクでスマホへ共有【V1.1】
- ・ **モニタリングFAXの統合** — まるっとLIFEで行っているモニタリング業務をつむぎへ一本化(新LIFE移行と同時)【V1.1】
- ・ **電子契約書・同意書** — 紙の契約・同意手続きの電子化【V1.2】
- ・ **ご家族への通知(メール)** — 既存のメール基盤で実装(追加費用ほぼゼロ)。LINEは利用状況を見て採否判断【V1.2】

バージョン3(2027年前半)

- ・ **送迎表AI版** — 住所・歩行状況・乗降所要時間・定員から送迎順を自動作成し3案提示(時間優先/距離優先/バランス)→自由編集。走行距離・所要時間・概算燃料費表示、地図ルート連携
- ・ カイポケ実績機能相当の実績管理・国保連請求(伝送) — 1月に調査開始、要件と費用対効果で着手判断
- ・ ネイティブアプリ化(iPad/スマホ/PCのインストール型アプリ)、勤務表(シフト)の本格運用

さらに先の構想(バージョン4以降)

- ・ LINE通知(メール通知の利用状況を見て)、多店舗横断の経営分析、計画書と外部システムの連携拡充 ほか

6. 端末と通信の方針

端末

用途	推奨	理由
現場での入力(記録・日誌・バイタル)	iPad等のタブレット	タップ入力が速い。持ち運びやすく担当者会議など外出先でも使える
印刷・帳票・管理業務	PC(各店舗に1台)	タブレットのブラウザ印刷は余白・ヘッダー/フッターの制御が難しく、帳票の仕上がりが安定しない。印刷はPCに寄せる
1台で済ませたい店舗	Windowsの2in1(タブレット型PC)	タブレット入力とPC品質の印刷を1台で両立できる折衷案

外出時の通信(訪問1回1時間程度・少量通信)

ポケットWi-Fiは今回の用途には過剰で、持ち出すと店舗で使えない問題もあるため推奨しません。つむぎの入力は文字中心で通信量が小さく、次の順で検討するのが低コストです。

順位	方法	月額目安	備考
1	スマホのテザリング(社用・スタッフ携帯)	0円	追加契約なし。まずこれで運用開始し、不便なら次へ
2	セルラー版iPad+povo2.0(eSIM)	基本0円	基本料0円で維持し、使う時だけ購入(例: 1GB/30日 390円前後)。半年に1回は有料購入が必要な点のみ注意
3	少量データSIM(日本通信 1GB 約290円/IIJmio データeSIM 2GB 440～850円)	300～900円	毎月確実に外出があるならこちら。eSIMなら即日開通

7. 主要マイルストーン

- 9月17日 — ケアマネ閲覧の自動化 実装完了(扇橋で検証開始)
- 9月30日 — V1機能凍結完了・扇橋店受入確認完了・第2陣研修完了・新LIFE実装完了
- 10月1日 — v1.0正式リリース。第1陣(南水元・東小岩・江古田)正式運用
- 10月13日 — 第2陣(西馬込・水元)運用開始
- 10月24日 — 送迎表(基本版)実装完了→扇橋試験へ
- 11月10日 — LIFE試験 第2サイクル提出完了(扇橋店)
- 12月1日 — V1.1(LIFE・送迎表・モニタリングFAX)配信開始
- 12月26日 — 第3陣導入完了(全店V1稼働)
- 2027年1月13日 — V1.2(電子契約・同意書・メール通知)配信開始
- 2027年2月末 — 全店定着フォロー完了・V3計画確定

8. 前提とリスク

リスク / 前提	影響	対応
新LIFEシステムの仕様変更・障害	V1.1が最大1ヶ月遅延	試験を1サイクル延長できる余白を確保。V1展開には影響させない
ケアマネ自動化のV1組込みによる9月の作業増	受入確認の圧迫	9/17実装完了を厳守。間に合わない場合は自動化のみ10月中旬のv1.0.1へ後ろ倒しし、リリース日は動かさない
V1.1の同梱数増(LIFE+送迎表+FAX統合)	試験が浅くなる	優先順はLIFE→送迎表→FAX統合。試験で問題が出た機能は外してV1.2へ回す(配信日は守る)
第3陣店舗の関心の低さ	導入の形骸化	第1陣の実績数値を説明会の材料に、月2店舗の伴走導入
V1凍結後の機能要望	スコープ再膨張	要望は「未来の修正点」へ記録し四半期計画で優先度判断
