TSUMUGI PROJECT PLAN

つむぎ 導入展開・バージョン計画
2026年9月〜2027年3月

作成日: 2026年9月1日　改訂日: 2026年10月5日・10月21日追記　作成: 本部(ワンズスタイル)　対象: 全FC店舗・FCコンサルタント共有用

版: 第6版

第6版への追記(2026年10月21日)

- **職員アンケートを実施**(10/16〜10/20・15件・7店舗)。「満足」以上が12人、「紙のころより楽になった」が13人、「不満」「大変になった」は0人。ご要望9件のうち6件は試験版で実装済み(1件は今ある機能で対応・2件は今後検討)。集計と対応は職員向けのまとめで共有した。
- **アンケートを受けた改善は「アンケート結果のアップデート」**として、試験版で店舗に確かめてもらい、10月末に安定版(全店)へ入れる予定。不具合の修正ではないため緊急アップデートにはせず、ふつうの更新として配信する。
- **LIFE と一人ずつのログインは別の回に分ける。**LIFE は 11/10 の提出で確かめてから、一人ずつのログイン(共有iPadのPIN切り替え)は 11/21 から安定版へ。同時に入れると、問題が起きたときに原因を切り分けにくいため。
- **データ保護(店舗データのログイン保護)は 10/20 に本番で完了。**ログインしないと店舗のデータを読めない仕組み。V1.1(12/1)は LIFE・モニタリングFAX・一人ずつのログインの区切りとする。
- 送迎表の改善期間(〜11/28)は、アンケート結果のアップデートで区切る予定。

第6版での改訂(2026年10月5日)

- **V1.0 は予定どおり 10月1日に正式リリース。**9月の全マイルストーン(ケアマネ閲覧の自動化・マニュアル整備・扇橋受入確認・新LIFE実装)を達成。
- **送迎表(基本版)は 10月5日に安定版へ前倒し配信**(計画では 10/24 実装完了 → 12/1 V1.1)。9/12〜10/4 に試験版で扇橋・江古田が先行試用し、店舗要望を反映した。
- 計画外の追加: 書類のPDFダウンロード(サーバー生成・iPadでもヘッダー/フッター無し)、クラス在籍表、血圧再検の方式、BMIグラフ、モニタリングの一括確定・自動確定、フェイスシートの整理と更新履歴。
- 店舗展開の実態: 南水元・東小岩・江古田・西馬込・水元は**すでに安定版で利用中**(10/1・10/13 は運用ルールの切替日)。第3陣は店舗ごとに個別に案内する。
- 不具合・要望の連絡は当面「**店舗 → 本部(高橋)へ直接**」(エリア担当者を介さない)。2027年1月の技術直結ライン全面移管は撤回し、FC店舗が増えた段階で集約を検討する。
- ガントチャートは達成済みをグレー、現在日を赤の点線で表示(計画の線は残す)。

1. 結論

方針

バージョン1は「現行機能+ケアマネ閲覧の自動化」で 10月1日に正式リリース済み(v1.0)。新機能はバージョン2として扇橋店で先行試験し、12月のV1.1(LIFE・モニタリングFAX)と1月のV1.2(電子契約・同意書・メール通知)の2回に分けてアップデート配信する。送迎表(基本版)は先行して 10月5日に全店へ配信した。

- **ケアマネ閲覧の自動化はV1に含めた** — どの店舗でもケアマネ登録が始まる可能性があるため。9月前半に実装し、扇橋の受入確認で検証してからリリースした。
- **LIFEをV1に含めない理由** — 実装約3週間+提出2サイクルの試験(2ヶ月)が必要で、含めると正式版が12月にずれ込み10月目標と両立しない。加えて2026年9月1日に旧LIFEが停止し国保中央会の新システムへ移管された直後で、当社の外に変動要素がある。実装は 9/30 に完了し、10月提出の第1サイクルを扇橋で試験中。
- **送迎表は日常業務のため前倒し** — 基本版(確定・運行表・連絡帳への時間反映・クラス在籍表)を試験版で扇橋・江古田が先行試用し、10月5日に安定版へ配信。12月のV1.1を待たない。AIによる送迎順自動作成はV3(2027年春)で拡張する。

2. バージョン管理・配信の方式(業界標準に準拠)

つむぎの更新の仕組みは、独自方式ではなく**主要WebサービスとSaaSで標準的に使われている手法**の組み合わせです。

手法(業界での呼称)	有名サービスでの例	つむぎでの適用
安定版と試験版の2本立て(段階的ロールアウト・カナリアリリース)	Google・Meta・Netflixなどが新機能を社内→一部ユーザー→全体の順で有効化	新機能は**試験版**(扇橋・江古田など希望店舗)で先に使い、問題がなければ**安定版**(全店)へ。不具合修正は安定版へ即時
リリーストレイン(定期リリース)	Chrome・Firefoxは機能の完成を待たず決まった周期で版を出す	メジャー更新は四半期1回。期限を先に決め、間に合った機能だけ乗せる
セマンティックバージョニング	多くのソフトの「v1.2.3」表記(大改訂.機能追加.修正)	v1.0(10/1)→v1.1(12月)→v1.2(1月)。アプリ内にも版数を表示
更新バナー+バックグラウンド自動更新	SlackやGmailの「新しいバージョンがあります。再読み込みしてください」	更新はアプリ内の「お知らせ」で案内し、裏で自動更新
チェンジログ(更新履歴)の公開	Notion・Figmaなどの「What's New / リリースノート」	変更管理台帳(全件・1000件超)+アプリ内「つむぎ運営からのお知らせ」


- **バグ修正の反映** — 安定版で直した修正は試験版にも同日に取り込む(逆も同じ)。取りこぼしが構造的に起きない。
- **新機能のアイデア** — すべて「未来の修正点」リストへ記録し、四半期ごとのバージョン計画で採否と優先度を決定する。


3. 店舗展開フェーズ

フェーズ	店舗	位置づけ	V1運用開始	状況(10/5時点)
第0陣	扇橋店	試作店舗(パイロット)	9月(受入確認) 達成	V1最終チェック完了。V2先行試験(試験版)を継続
第1陣	南水元店・東小岩店・江古田店	提供記録・日誌を活用中	10月1日 達成	正式運用へ切替済み。江古田店は**準試作店舗**(個別運動あり店舗の代表として、送迎表など更新を扇橋店と共に先行確認)
第2陣	西馬込店・水元店	関心あり	10月13日(運用ルール切替)	両店とも安定版で利用開始済み。研修・初期設定は 10/10 まで
第3陣	その他店舗	関心が薄い層	11月〜12月	決め打ちせず**店舗ごとに個別**に案内。第1陣の実績数値を材料に伴走導入

各店舗の導入窓口は店舗の管理者とする(つむぎの操作の中心が管理者のため)。研修・問い合わせ・受入確認・テスト協力の依頼はすべて管理者経由で行う。不具合・要望の連絡は当面**店舗から本部(高橋)へ直接**とし、エリア担当者には「更新まとめ」資料で内容を共有する。FC店舗が増えた段階で、エリア担当者への集約を改めて検討する。体制の詳細は別紙「つむぎ導入体制図」参照。

4. ガントチャート

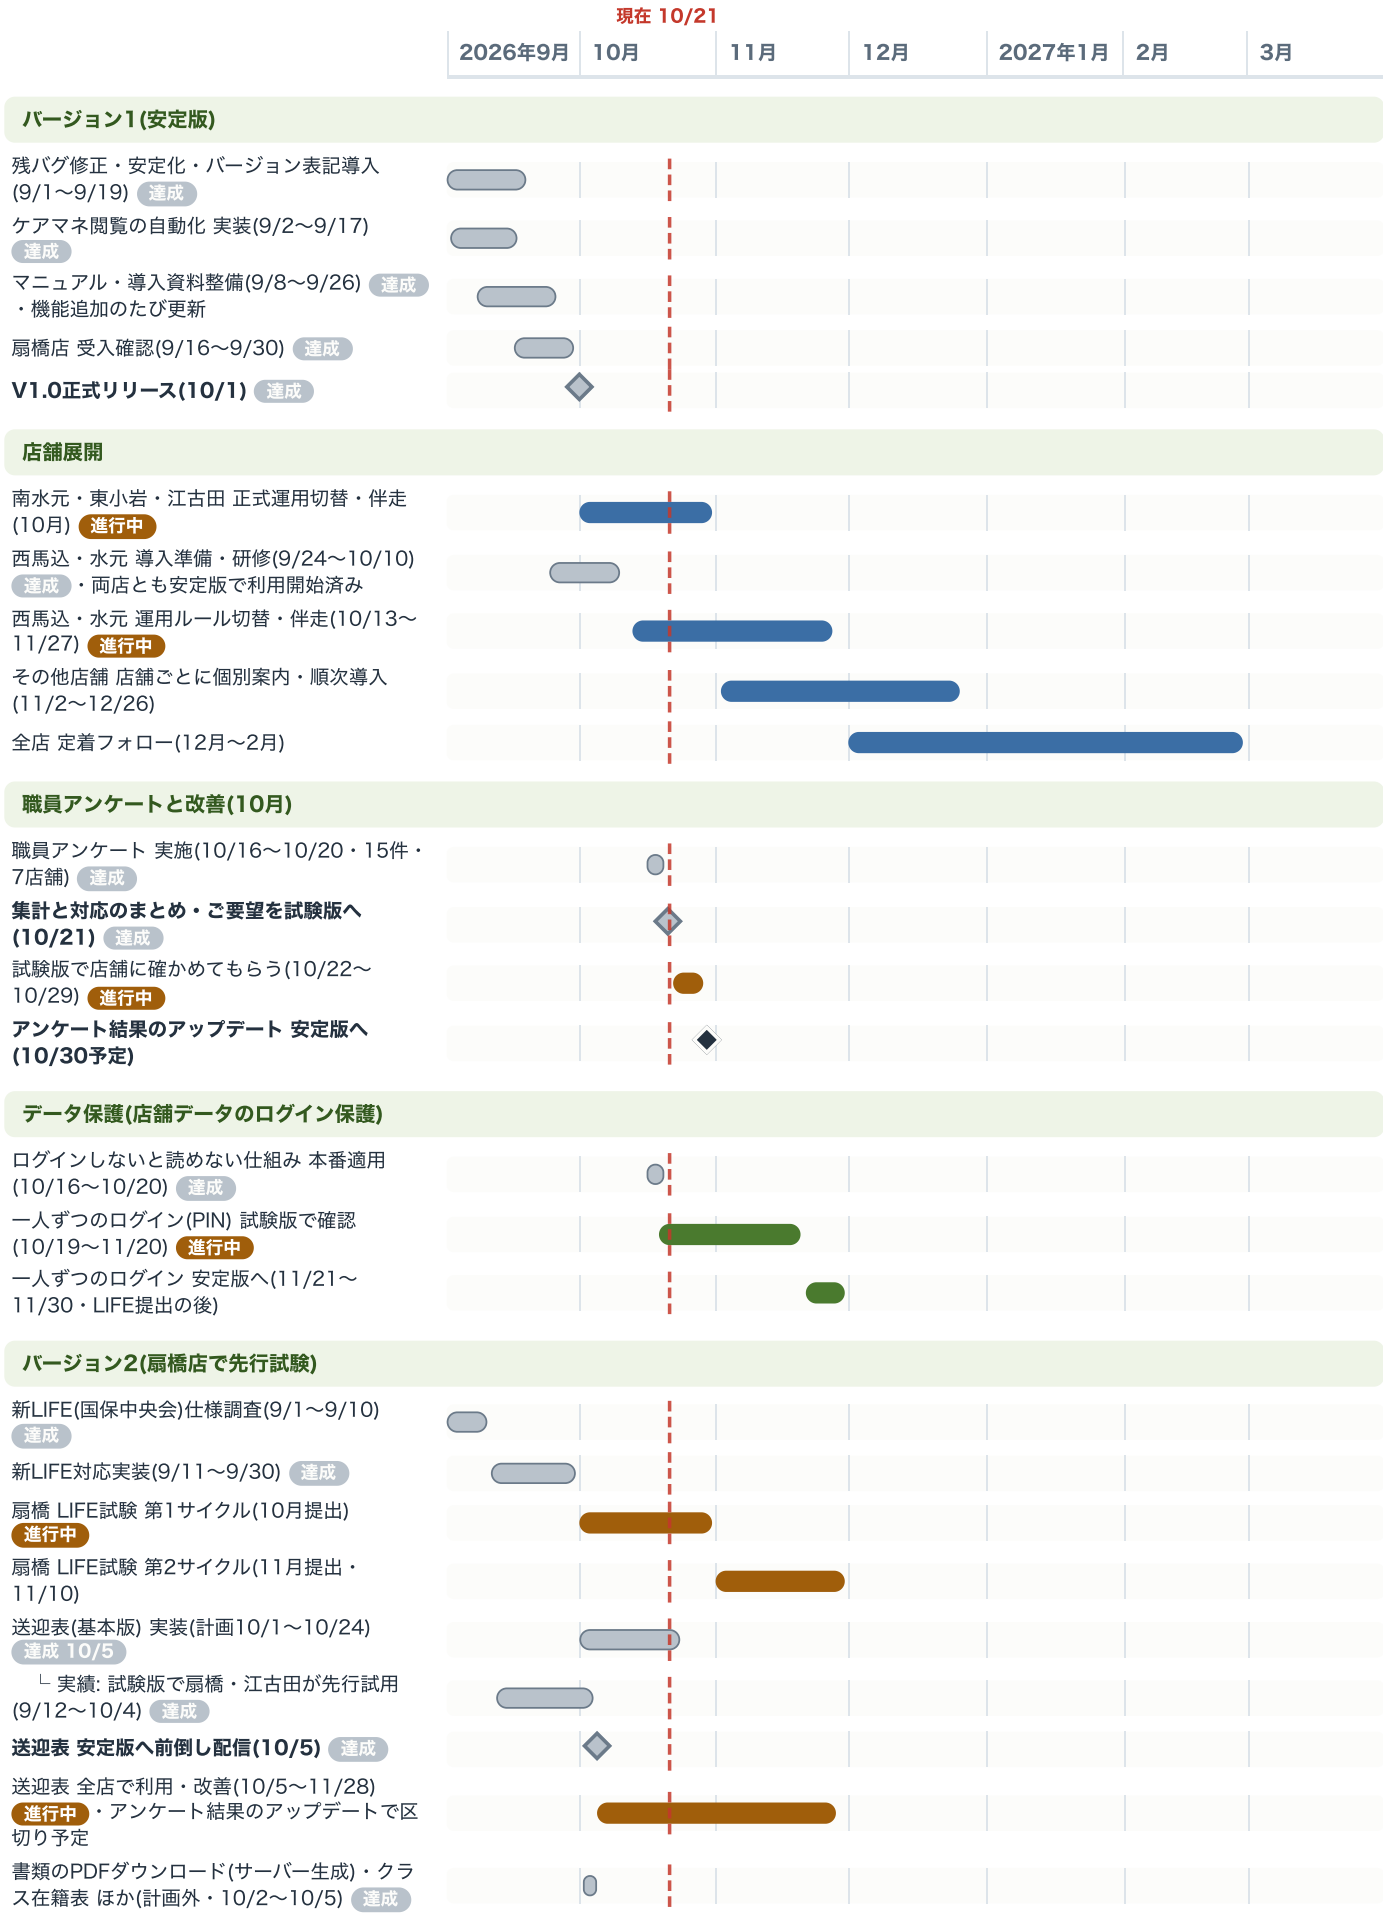
現在 10/21
2026年9月
10月
11月
12月
2027年1月
2月
3月
バージョン1(安定版)
残バグ修正・安定化・バージョン表記導入(9/1〜9/19) 達成
ケアマネ閲覧の自動化 実装(9/2〜9/17) 達成
マニュアル・導入資料整備(9/8〜9/26) 達成
・機能追加のたび更新
扇橋店 受入確認(9/16〜9/30) 達成
V1.0正式リリース(10/1) 達成
店舗展開
南水元・東小岩・江古田 正式運用切替・伴走(10月) 進行中
西馬込・水元 導入準備・研修(9/24〜10/10) 達成・両店とも安定版で利用開始済み
西馬込・水元 運用ルール切替・伴走(10/13〜11/27) 進行中
その他店舗 店舗ごとに個別案内・順次導入(11/2〜12/26)
全店 定着フォロー(12月〜2月)
職員アンケートと改善(10月)
職員アンケート 実施(10/16〜10/20・15件・7店舗) 達成
集計と対応のまとめ・ご要望を試験版へ(10/21) 達成
試験版で店舗に確かめてもらう(10/22〜10/29) 進行中
アンケート結果のアップデート 安定版へ(10/30予定)
データ保護(店舗データのログイン保護)
ログインしないと読めない仕組み 本番適用(10/16〜10/20) 達成
一人ずつのログイン(PIN) 試験版で確認(10/19〜11/20) 進行中
一人ずつのログイン 安定版へ(11/21〜11/30・LIFE提出の後)
バージョン2(扇橋店で先行試験)
新LIFE(国保中央会)仕様調査(9/1〜9/10) 達成
新LIFE対応実装(9/11〜9/30) 達成
扇橋 LIFE試験 第1サイクル(10月提出) 進行中
扇橋 LIFE試験 第2サイクル(11月提出・11/10)
送迎表(基本版) 実装(計画10/1〜10/24) 達成 10/5
└ 実績: 試験版で扇橋・江古田が先行試用(9/12〜10/4) 達成
送迎表 安定版へ前倒し配信(10/5) 達成
送迎表 全店で利用・改善(10/5〜11/28) 進行中・アンケート結果のアップデートで区切り予定
書類のPDFダウンロード(サーバー生成)・クラス在籍表 ほか(計画外・10/2〜10/5) 達成

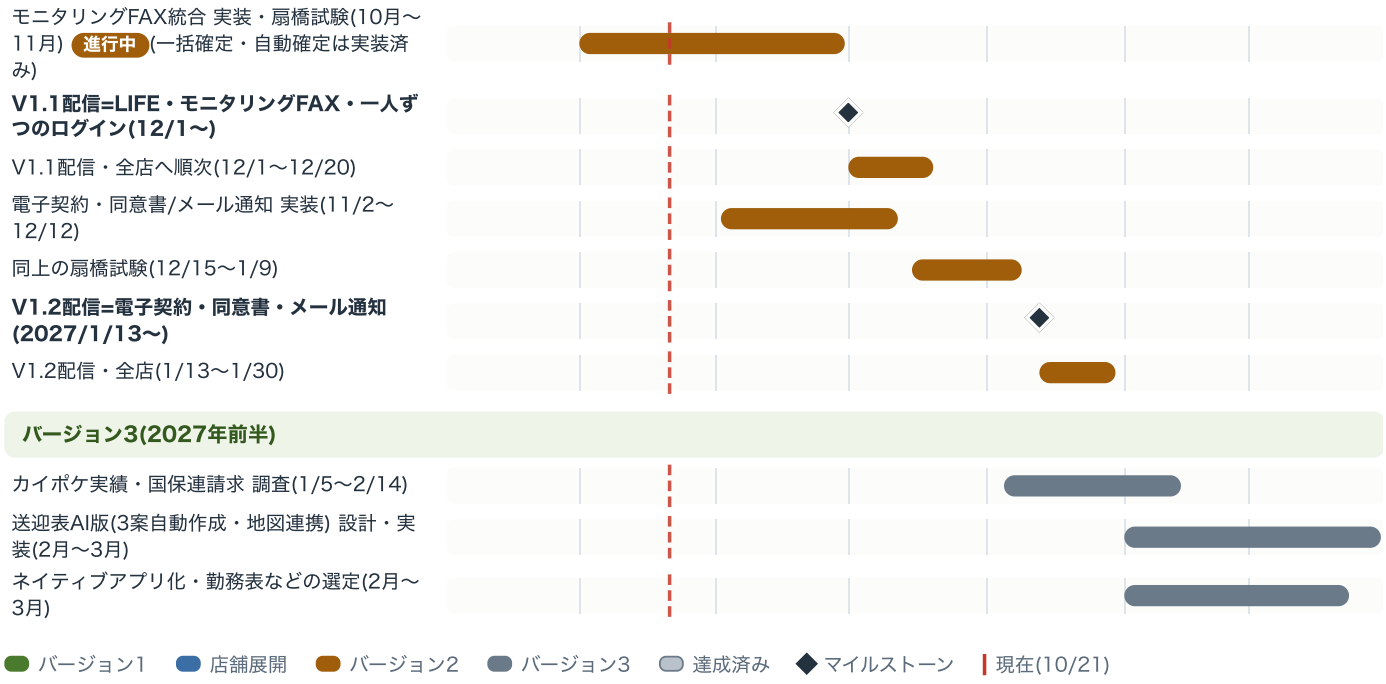

LIFEの提出はサービス提供月の翌月10日が期限のため、各サイクルの頭10日で提出し、残りで検証・修正を行います。新LIFE側の障害等があれば試験を1サイクル延長し、V1.1は1月へ後ろ倒しします(V1の展開には影響させない)。

5. 各バージョンのスコープ

バージョン1 = v1.0(2026年10月1日 正式リリース済み)

- 利用者マスタ管理(名簿・フェイスシート・保険証/負担割合証・履歴・CSV入出力)
- サービス提供記録入力・業務日誌・連絡帳・カレンダー(休業日/半日休業対応)
- 月間スケジュール・振替・欠席/休止管理、体力測定、モニタリング(AI下書き・自動FAX)
- 通所介護計画書・機能訓練計画書・初回報告、担当者会議記録(フロートメモ)
- 家族・ご本人・ケアマネの閲覧ポータル(招待メール・パスワード自己リセット・お知らせ配信)
- **ケアマネ閲覧の自動化** — 担当者単位のアカウント: 1回の登録で担当利用者を自動閲覧・担当変更で自動切替
- ケアマネ事業所・担当者管理、分析(個人/稼働・定員ベース稼働率)、複数端末同期の保護機構
- **10/5 追加配信** — 送迎表(基本版)、クラス在籍表、書類のPDFダウンロード(サーバー生成)、血圧再検の方式、BMIグラフ、モニタリングの一括確定・自動確定、フェイスシートの整理と更新履歴
- **10月末 追加配信(予定)＝アンケート結果のアップデート** — 職員アンケートのご要望を受けた改善(提供記録の行の枠と印・特記の一言・運動の一括○・体力測定の備考・送迎表の送りの時間・連絡帳の送り時間反映・1日の運行表(A4横)・同じ日の振替・大きい画面での表示 ほか)。試験版で店舗が確かめてから全店へ

バージョン2 → V1.1(12月)・V1.2(2027年1月)として配信

- **新LIFE(国保中央会)対応** — 4様式CSV提出支援・過去データのリカバリー出力・フィードバック票取込 【V1.1・実装済み、扇橋で提出試験中】
- **送迎表(基本版)** — 日誌の車両・定員をもとに週間運行表(迎え/送り・氏名・時間・次回)。時間は連絡帳へ自動反映、休業・振替・休止も反映。確定・確定の解除・変更箇所の赤丸・Googleマップのルート共有

【10/5 安定版へ配信済み。11月末まで改善を続ける】

- **モニタリングFAXの統合** — まるっとLIFEで行っているモニタリング業務をつむぎへ一本化(新LIFE移行と同時)【V1.1】
- **電子契約書・同意書** — 紙の契約・同意手続きの電子化【V1.2】
- **ご家族への通知(メール)** — 既存のメール基盤で実装(追加費用ほぼゼロ)。LINEは利用状況を見て採否判断【V1.2】
- **データ保護の仕上げ(一人ずつのログイン)** — 店舗のデータは 10/20 からログインしないと読めない仕組みで保護済み。仕上げとして職員一人ずつのログインと、共有iPadの PIN 切り替えを入れる【V1.1・11/21 から安定版へ】

バージョン3(2027年前半)

- **送迎表AI版** — 住所・歩行状況・乗降所要時間・定員から送迎順を自動作成し3案提示(時間優先/距離優先/バランス)→自由編集。走行距離・所要時間・概算燃料費表示、地図ルート連携
- カイポケ実績機能相当の実績管理・国保連請求(伝送) — 1月に調査開始、要件と費用対効果で着手判断
- ネイティブアプリ化(iPad/スマホ/PCのインストール型アプリ)、勤務表(シフト)の本格運用

さらに先の構想(バージョン4以降)

- LINE通知(メール通知の利用状況を見て)、多店舗横断の経営分析、計画書と外部システムの連携拡充 ほか

6. 端末と通信の方針

端末

用途	推奨	理由
現場での入力(記録・日誌・バイタル)	iPad等のタブレット	タップ入力が速い。持ち運びやすく担当者会議など外出先でも使える
印刷・帳票・管理業務	PC(各店舗に1台)	帳票は10月からサーバーでPDFを作る方式に変え、iPadでもヘッダー/フッター無しの同じ仕上がりになった。複合機への印刷・FAXは引き続きPCが確実
1台で済ませたい店舗	Windowsの2in1(タブレット型PC)	タブレット入力とPC品質の印刷を1台で両立できる折衷案

外出時の通信(訪問1回1時間程度・少量通信)

ポケットWi-Fiは今回の用途には過剰で、持ち出すと店舗で使えない問題もあるため推奨しません。つむぎの入力は文字中心で通信量が小さく、次の順で検討するのが低コストです。

順位	方法	月額目安	備考
1	スマホのテザリング(社用・スタッフ携帯)	0円	追加契約なし。まずこれで運用開始し、不便なら次へ
2	セルラー版iPad+povo2.0(eSIM)	基本0円	基本料0円で維持し、使う時だけ購入(例: 1GB/30日 390円前後)。半年に1回は有料購入が必要な点のみ注意
3	少量データSIM(日本通信 1GB 約290円/IIJmio データeSIM 2GB 440〜850円)	300〜900円	毎月確実に外出があるならこちら。eSIMなら即日開通

7. 主要マイルストーン

1. **9月17日** — ケアマネ閲覧の自動化 実装完了(扇橋で検証開始) 達成
2. **9月30日** — V1機能凍結完了・扇橋店受入確認完了・第2陣研修完了・新LIFE実装完了 達成
3. **10月1日** — v1.0正式リリース。第1陣(南水元・東小岩・江古田)正式運用 達成
4. **10月5日** — 送迎表(基本版)・クラス在籍表・PDFダウンロードを安定版へ配信(計画 10/24 → 前倒し) 達成
5. **10月13日** — 第2陣(西馬込・水元)運用ルール切替 達成
6. **10月16日〜20日** — 職員アンケート(15件・7店舗)。「満足」以上12人・「紙のころより楽になった」13人 達成
7. **10月20日** — データ保護(ログインしないと店舗のデータを読めない仕組み)を本番に適用 達成
8. **10月21日** — アンケートの集計と対応のまとめを共有・ご要望6件を試験版で実装 達成
9. **10月30日(予定)** — アンケート結果のアップデートを安定版(全店)へ(ふつうの更新)
0. **11月10日** — LIFE試験 第2サイクル提出完了(扇橋店)
1. **11月21日〜30日** — データ保護の仕上げ(一人ずつのログイン・PIN)を安定版へ
2. **11月28日** — 送迎表 全店利用の改善期間 終了(アンケート結果のアップデートで区切る予定)
3. **12月1日** — V1.1(LIFE・モニタリングFAX・一人ずつのログイン)配信開始
4. **12月26日** — 第3陣導入完了(全店V1稼働)
5. **2027年1月13日** — V1.2(電子契約・同意書・メール通知)配信開始
6. **2027年2月末** — 全店定着フォロー完了・V3計画確定

8. 品質保証(テスト運用)

システム安定のため、業界標準のテスト運用(回帰テスト・スモークテスト・受入テスト)を導入しています。全テスト項目は「つむぎ テスト項目一覧」として一覧化し、**正常系・準正常系・異常系**の3層で管理します(同期系・操作系・帳票系・アカウント系・外部連携系など16分類・約70項目)。

- **項目は減らさない** — 一度追加したテスト項目は、その機能が廃止されない限り削除しない(新機能で増える一方でよい)。過去の不具合の再発防止を積み上げる回帰テストの標準的な考え方。
- **毎配信(自動)** — 構文検査・データ整合・本番生存確認など16項目の自動テストに加え、単体テスト23項目・画面操作テスト24項目(iPad相当)を実行し、失敗したら配信しない。
- **月1回(スモーク)** — 扇橋店で主要26項目を約30分で実施。
- **四半期(全量)** — V1.x配信の前に全項目を実施。新機能はテスト項目を追加してから安定版へ。
- **厳しさ** — 厳しめを基準とする。介護記録は行政監査・請求根拠・個人情報に関わるため、同期系とアカウント系は異常系(通信断・同時編集・不正操作)まで必須。表示系は正常+準正常中心とメリハリをつける。

9. 前提とリスク

リスク / 前提	影響	対応
新LIFEシステムの仕様変更・障害	V1.1が最大1ヶ月遅延	試験を1サイクル延長できる余白を確保。V1展開には影響させない
送迎表を前倒し配信したことによる現場の問い合わせ増	本部の対応時間の圧迫	更新のたびにマニュアル・エリア担当者向け「更新まとめ」を更新し、アプリ内お知らせで案内。不具合は安定版へ即日修正
V1.1の同梱数増(LIFE+FAX統合)	試験が浅くなる	優先順はLIFE→FAX統合。試験で問題が出た機能は外してV1.2へ回す(配信日は守る)
第3陣店舗の関心の低さ	導入の形骸化	第1陣・第2陣の実績数値を材料に、店舗ごとに個別案内・伴走導入
V1凍結後の機能要望	スコープ再膨張	要望は「未来の修正点」へ記録し、小さな改善は試験版で先に試してから安定版へ
試験版の変更が多い(10/9以降 約200件)	安定版へ移すときの確認が重くなる	「アンケート結果のアップデート」として1回にまとめ、LIFE(11/10提出の確認後)と一人ずつのログインは別の回に分ける。移す前に全テストと店舗での確認
